

RELATÓRIO DE BALANÇO 2020

PRINCIPAIS NOTAS

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

1 - INTRODUÇÃO

2 – EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO

3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

4 – ANÁLISE FOFA

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

1 - INTRODUÇÃO

Alinhado aos desígnios do Plano de Desenvolvimento Nacional – PDN (2018-2022), o Presidente da República e Titular do Poder Executivo aprovou o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios – PIIM, que constitui um instrumento de planeamento e gestão de projectos, traduzindo-se numa ampla e integrada plataforma para a resolução de vários problemas de natureza social, no contexto do processo de concretização da desconcentração administrativa e financeira.

O PIIM visa reforçar, de acordo com as disposições constantes do Decreto Presidencial n.º 20/18, de 29 de Janeiro, que estabelece o Regime Geral de Delimitação e Desconcentração de Competências e Coordenação da Actuação Territorial da Administração Central e da Administração Local do Estado, a desconcentração administrativa há muito iniciada e preparar a estrutura de transição para o processo de descentralização administrativa.

1 - INTRODUÇÃO


Após a aprovação do OGE revisto para o ano de 2019 em que foram incorporados os Projectos PIIM no PIP daquele ano, Sua Excelência o Presidente da República procedeu, em 27 de Junho de 2019, à apresentação pública deste importante Programa do Executivo, tendo nessa altura sido evidenciados os seus objectivos, a sua organização e as fontes do seu financiamento.

Este Relatório faz um breve balanço das actividades desenvolvidas pelos Departamentos Ministeriais, Governos Provinciais e Administrações Municipais responsáveis pela Execução dos projectos que integram a carteira do PIIM, no período de 1 de Janeiro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020.

Com base nos resultados apurados, neste relatório procede-se a uma análise global do Programa, com a apresentação dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das oportunidades que o mesmo proporciona e das eventuais ameaças a enfrentar.


2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

Evolução do cumprimento das condições precedentes

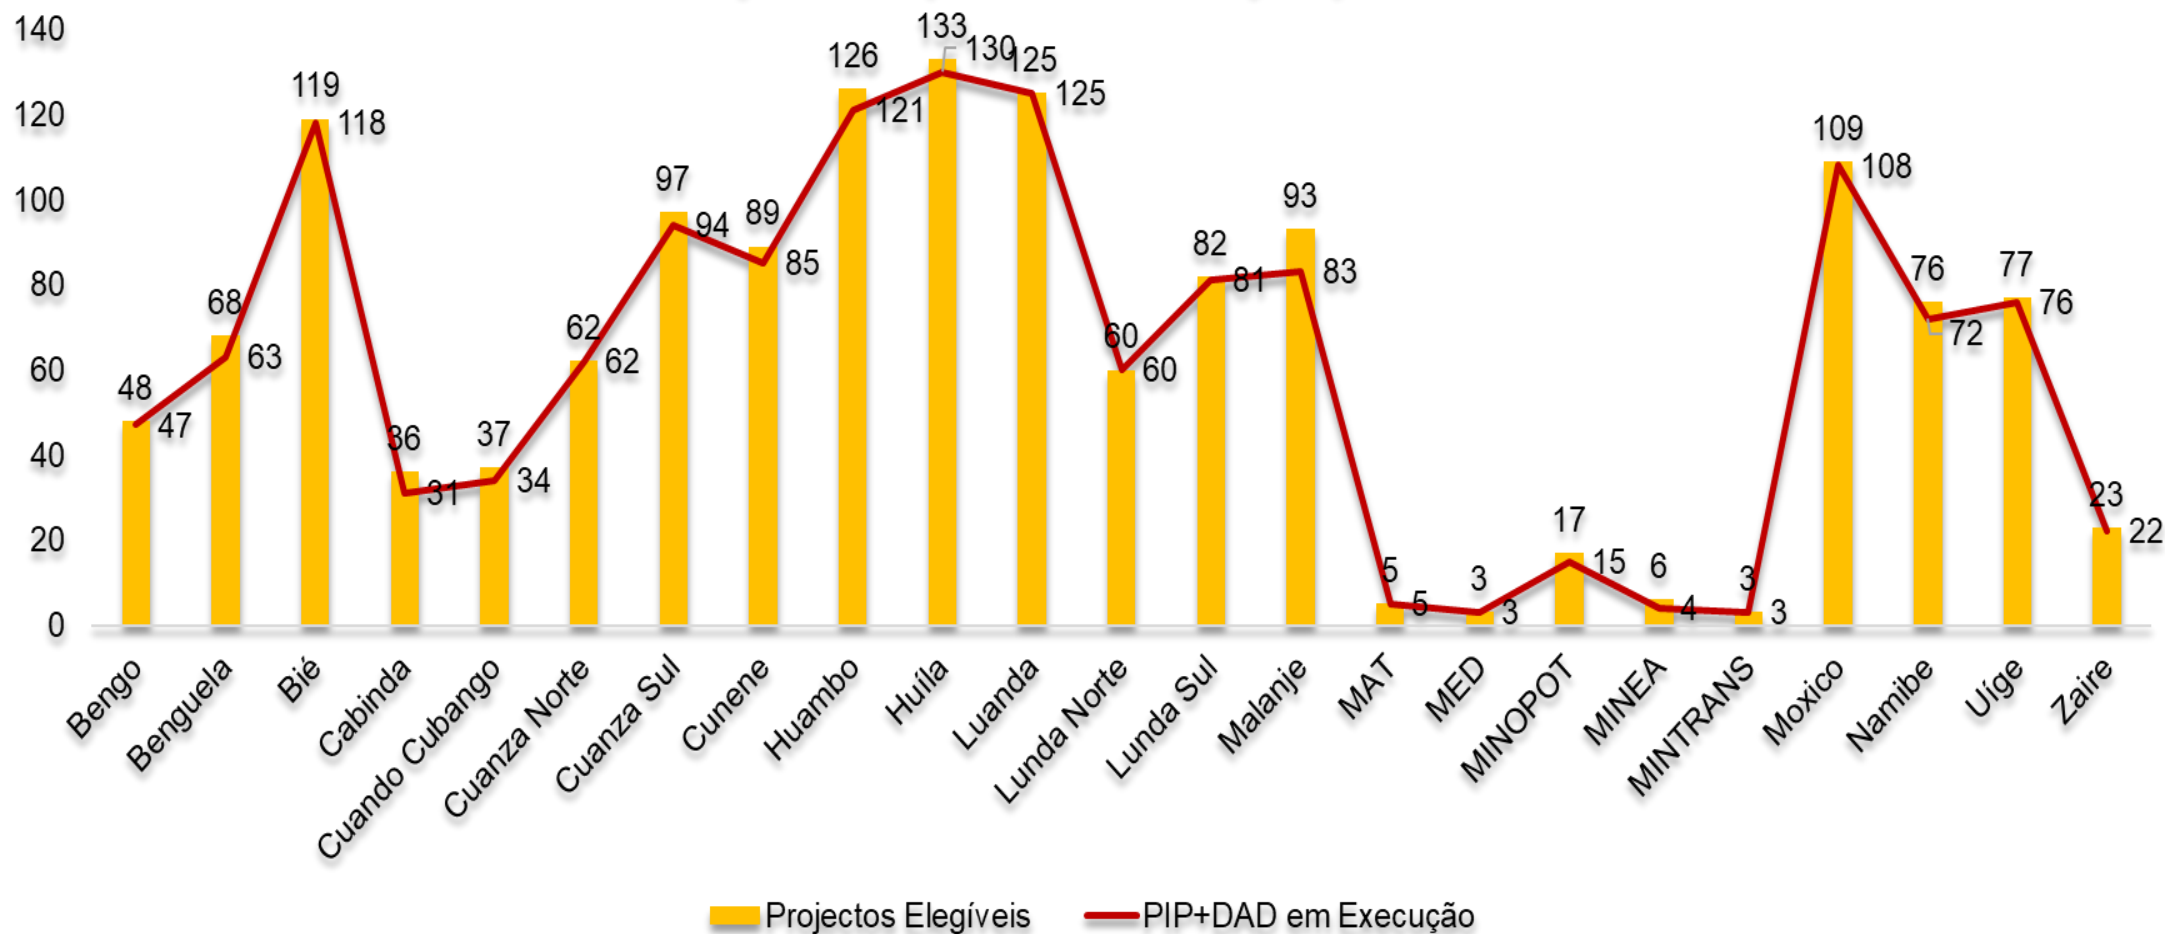


2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

Evolução Mensal de Projectos em execução no PIIM

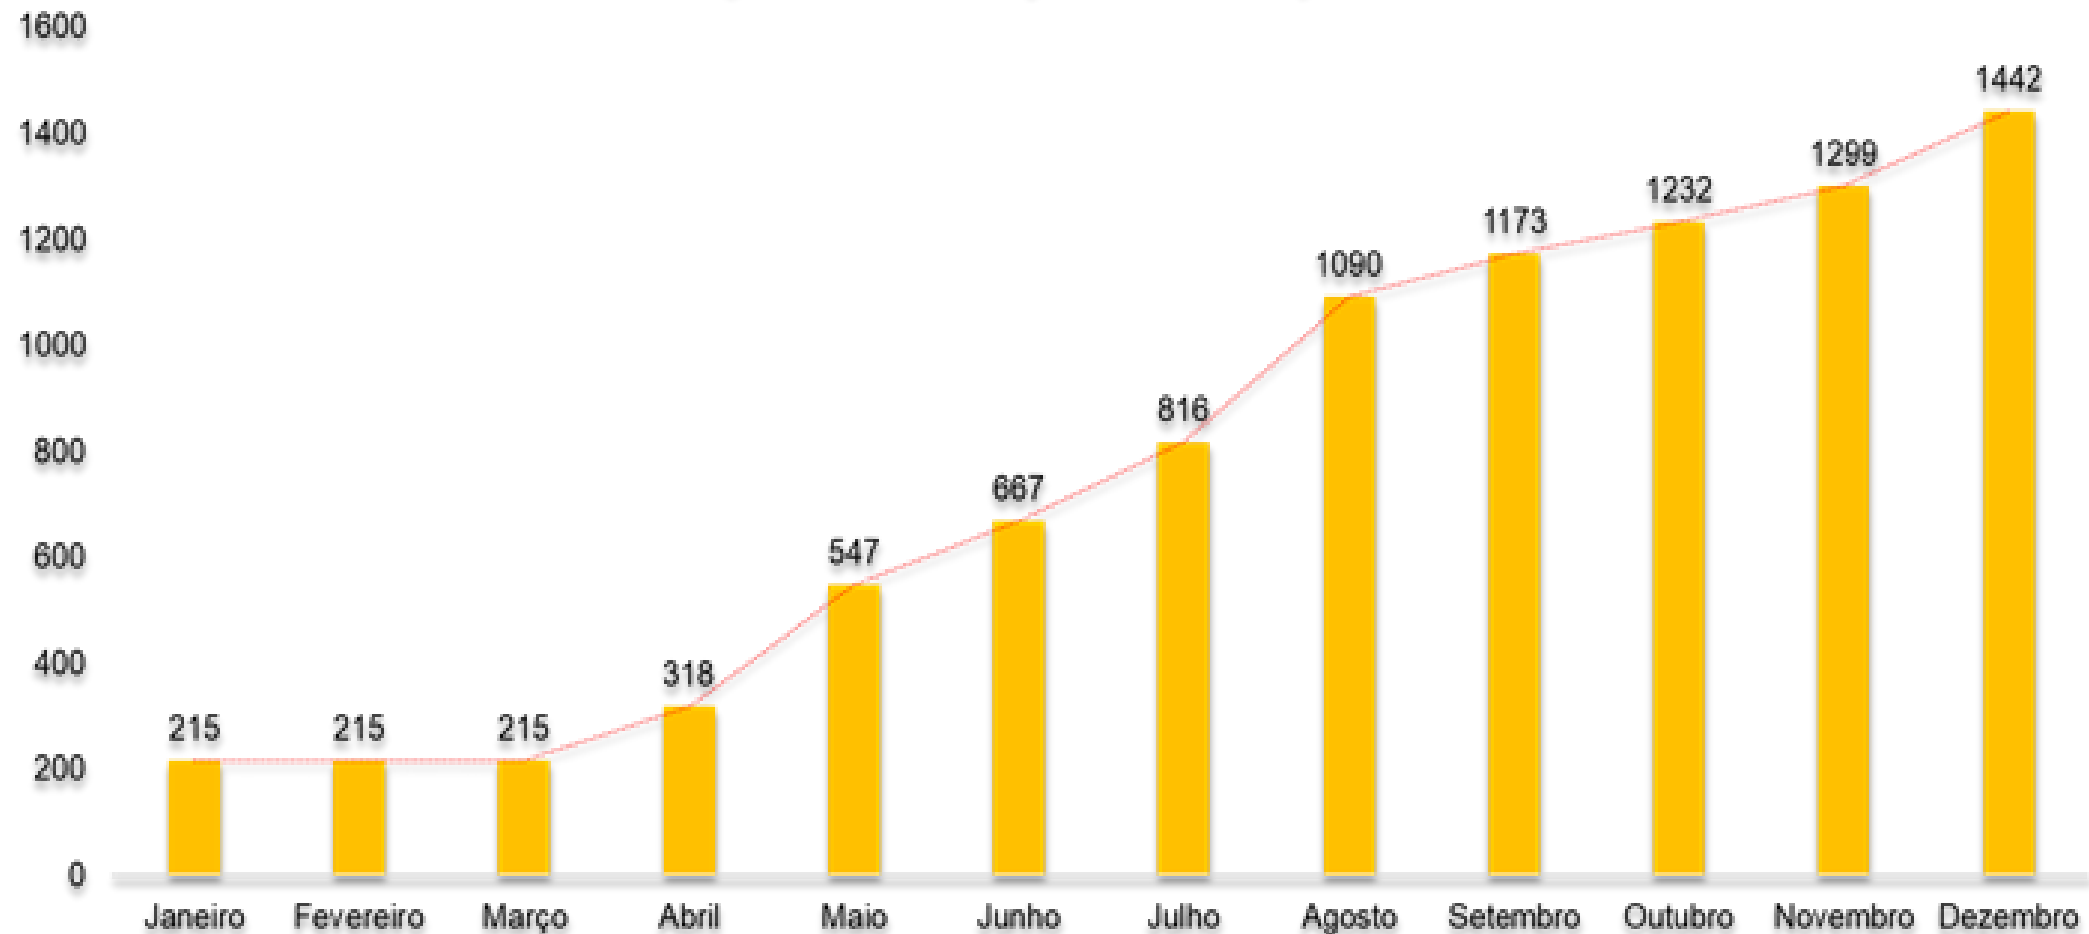


2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

Projectos de Âmbito Central

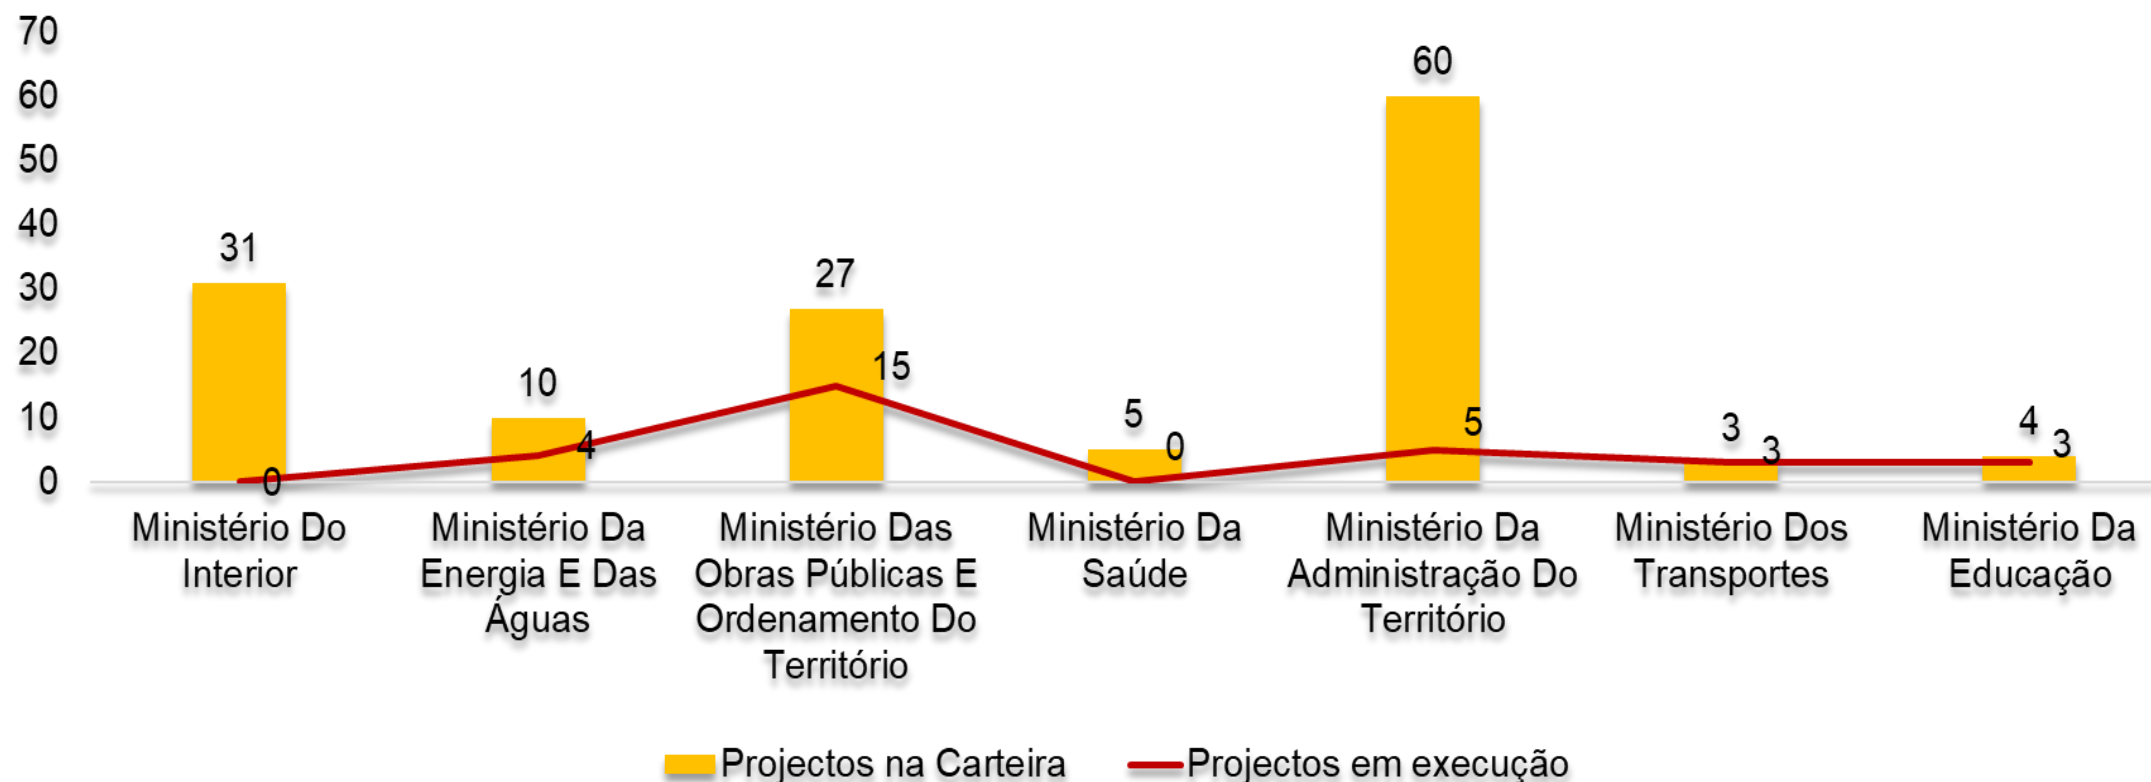


Em sede da execução financeira dos Órgãos Centrais, foi liquidado cerca de AKz.45.164.329.427,13.

2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

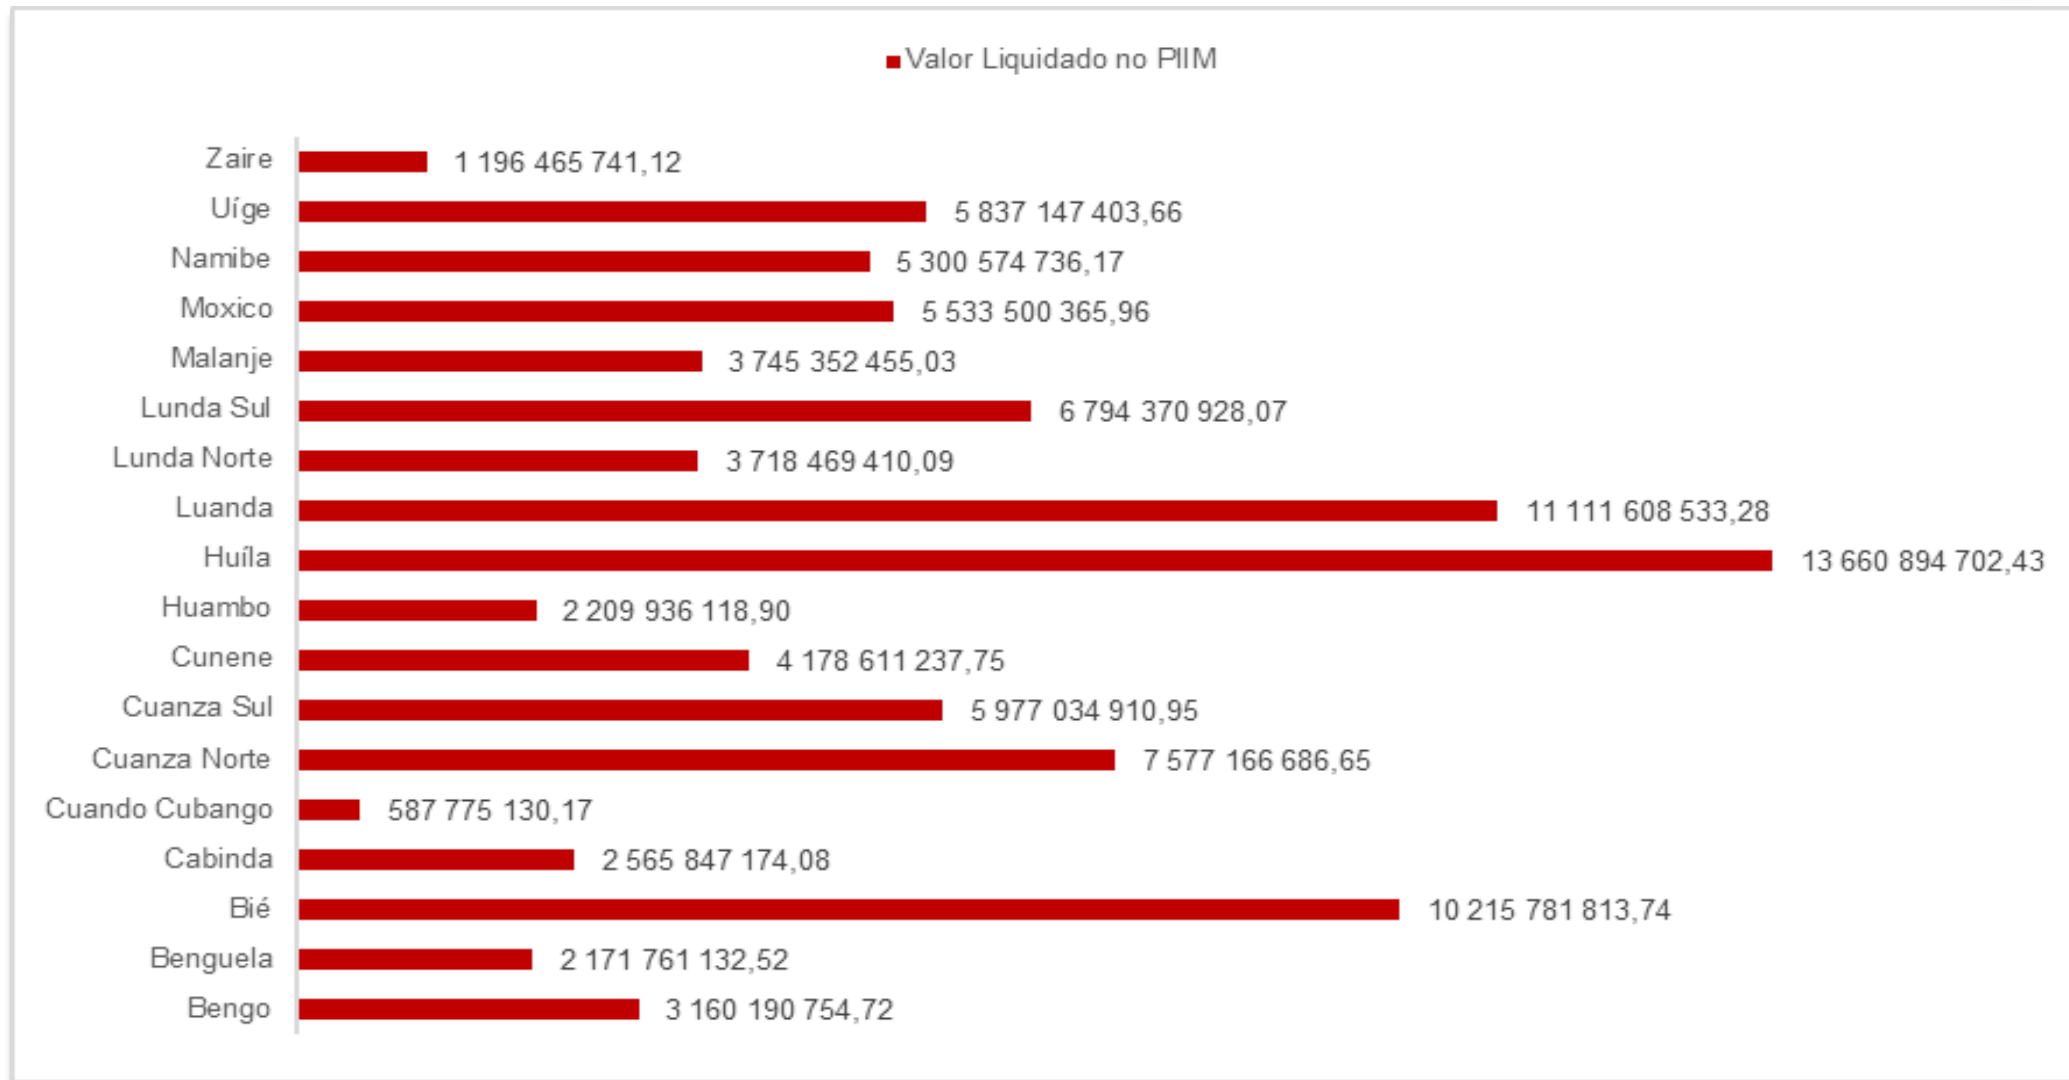

2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

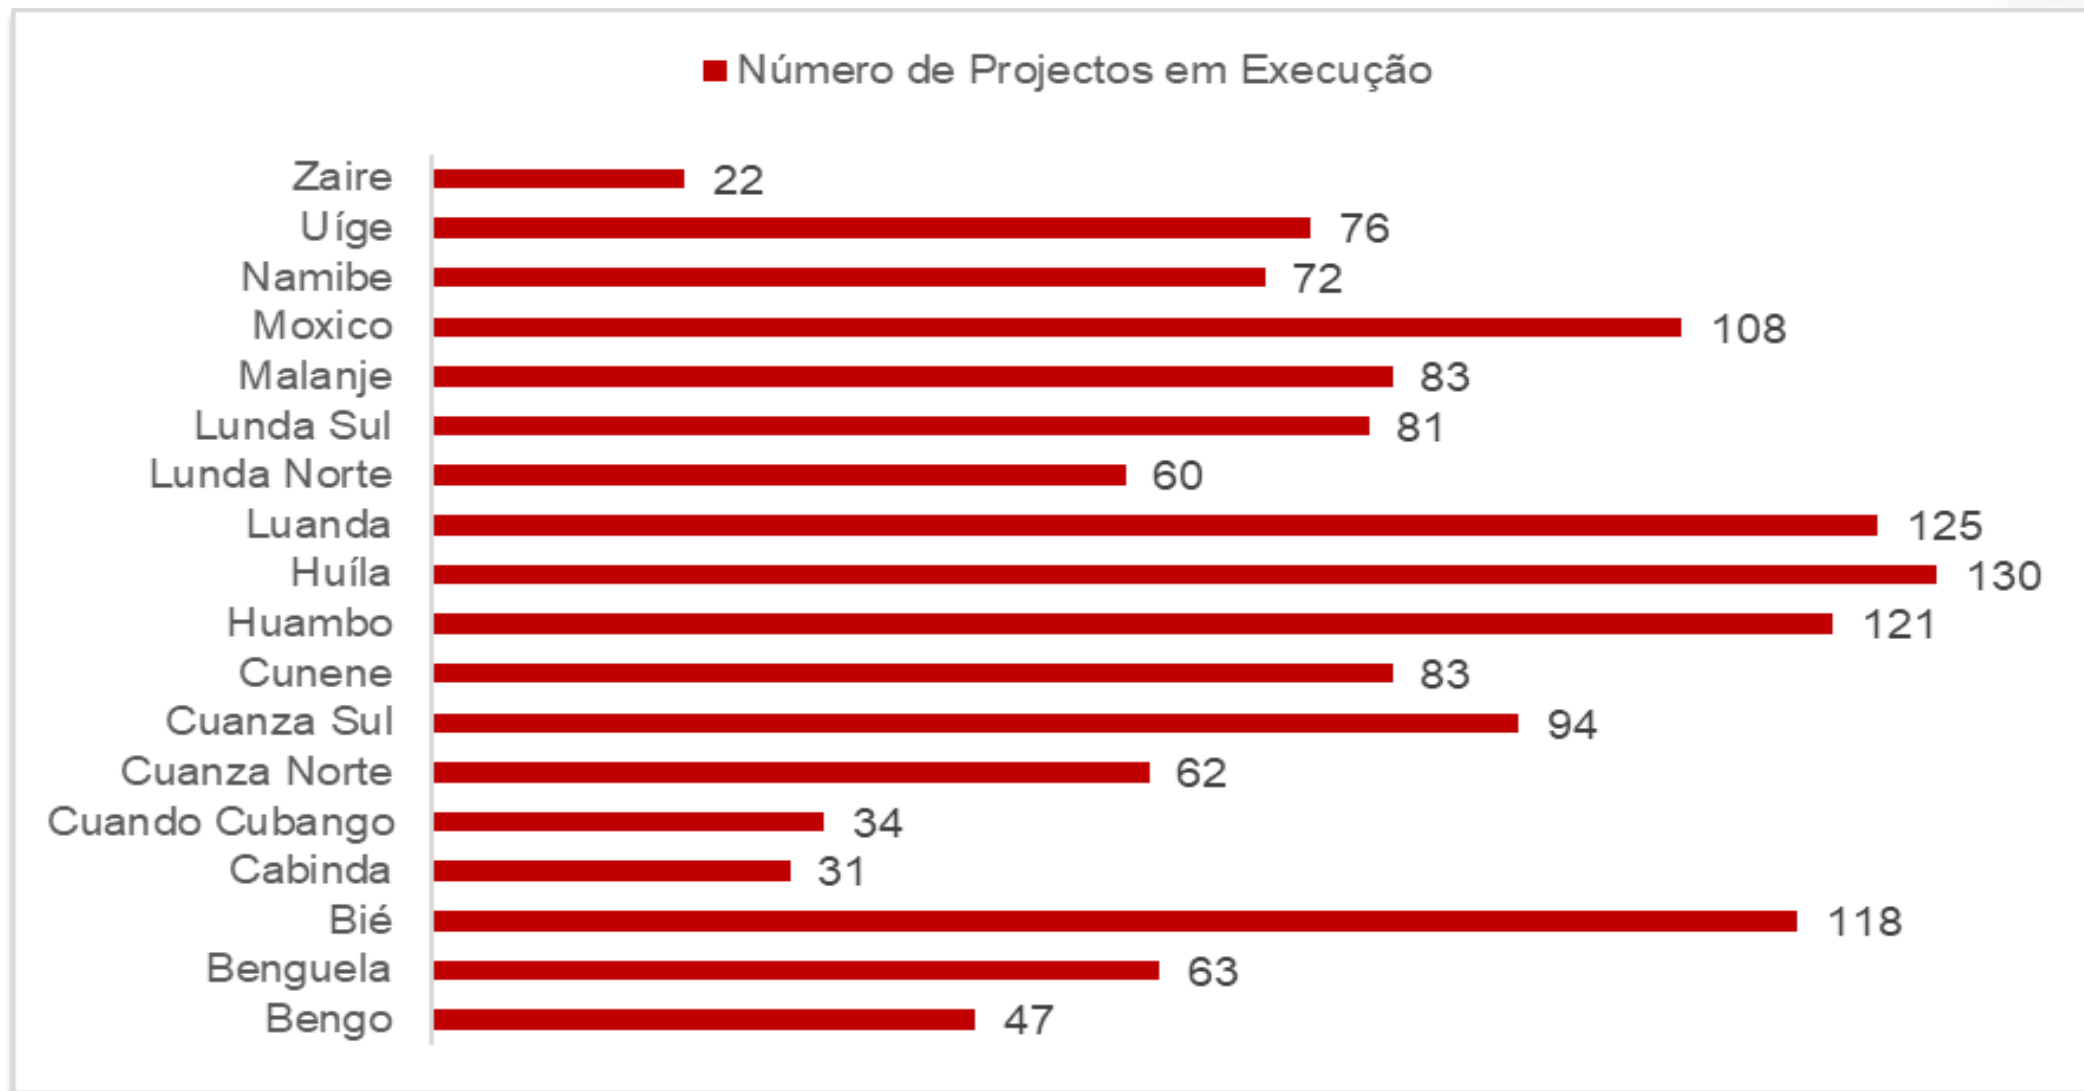

2 - EXECUÇÃO GLOBAL DO PIIM

Em suma o PIIM apresenta os seguintes indicadores globais:

- Execução financeira global : **AKz.140.792.043.665,22.**
- Execução financeira em 2020: **AKz.131.235.474.451,12.**
- Projectos Elegíveis – **1494 (1285 PIP e 209 DAD) - 85,86%**
- Projectos em execução – **1442 (1238 PIP e 204 DAD) 82,87%**



3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

EDUCAÇÃO



3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

ENERGIA E ÁGUAS

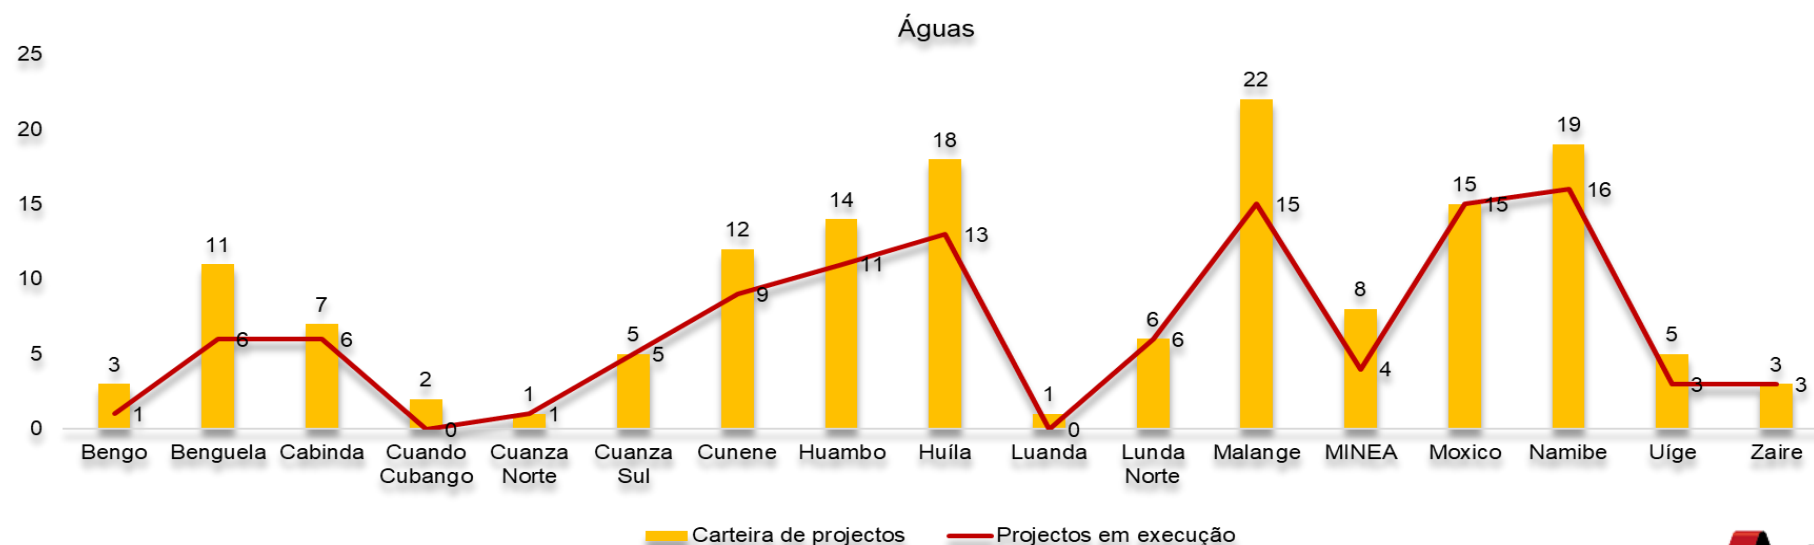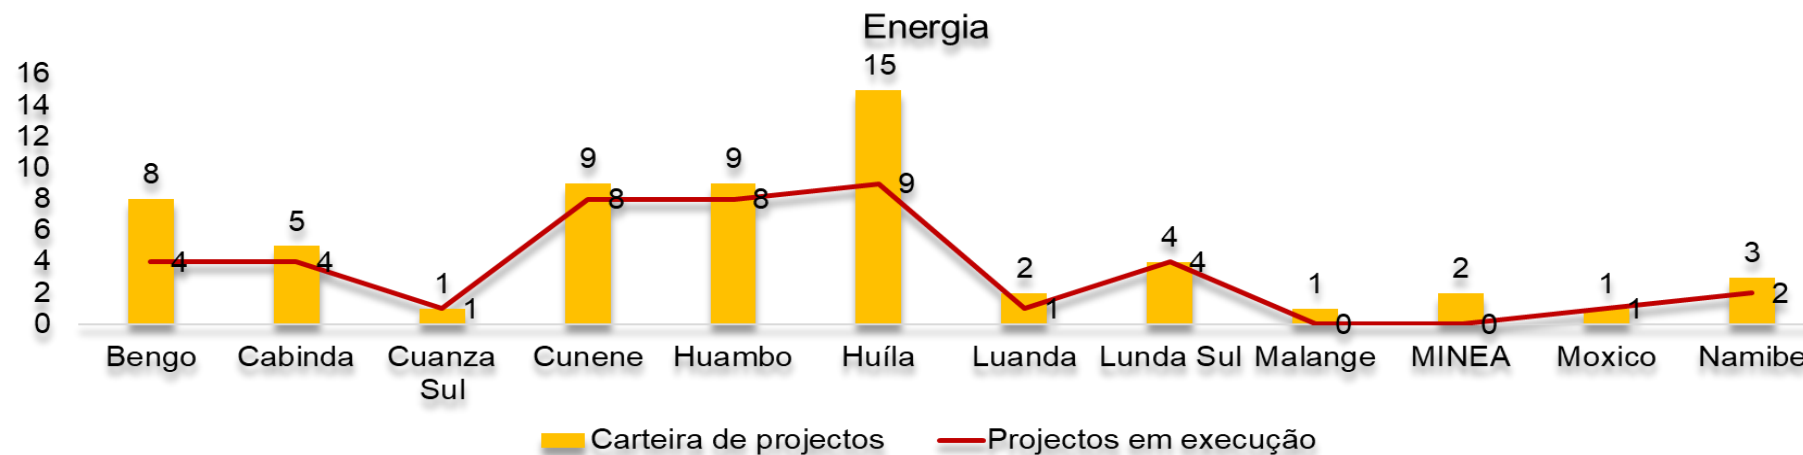


3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

INFRAESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS



3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR


SANEAMENTO E RESÍDUOS (AMBIENTE)

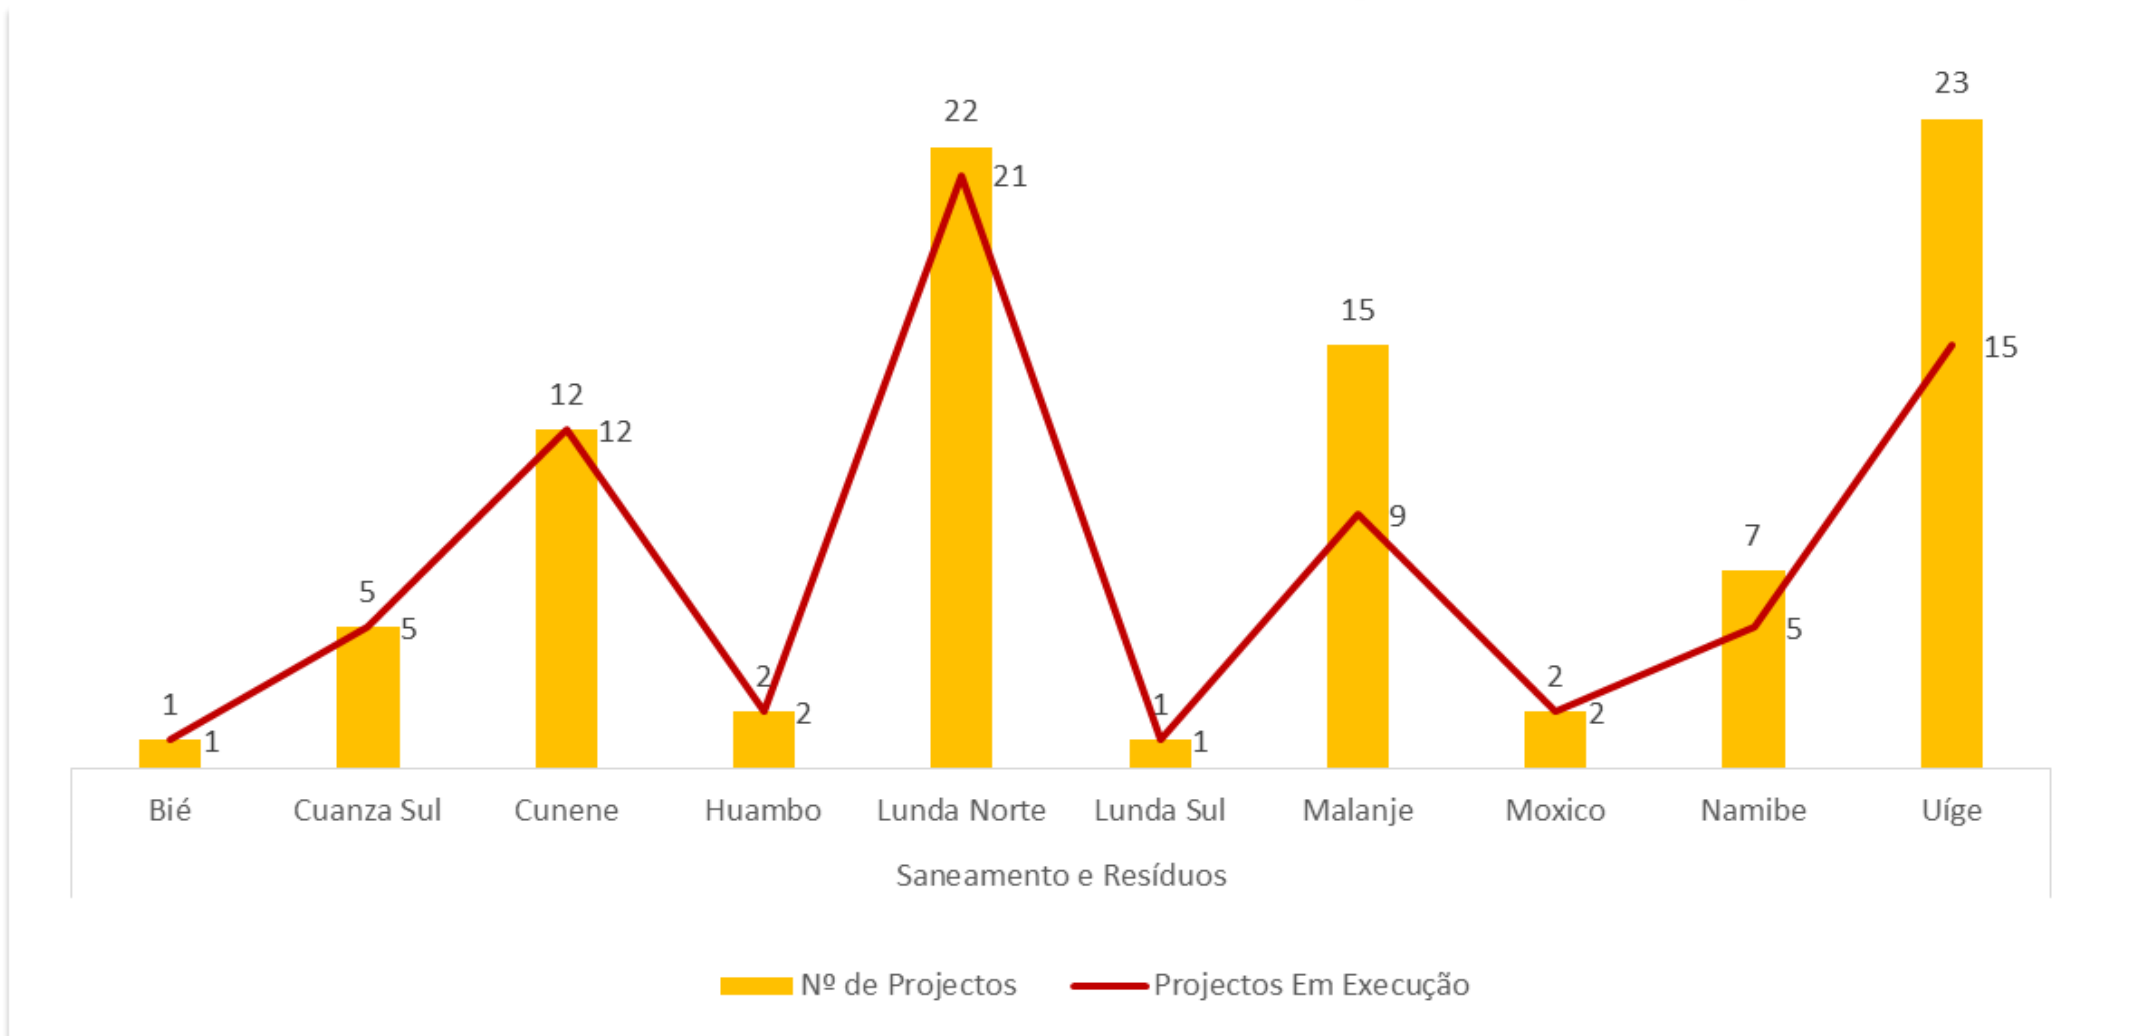

3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

SAÚDE


Quantidade de projectos do sector da Saúde

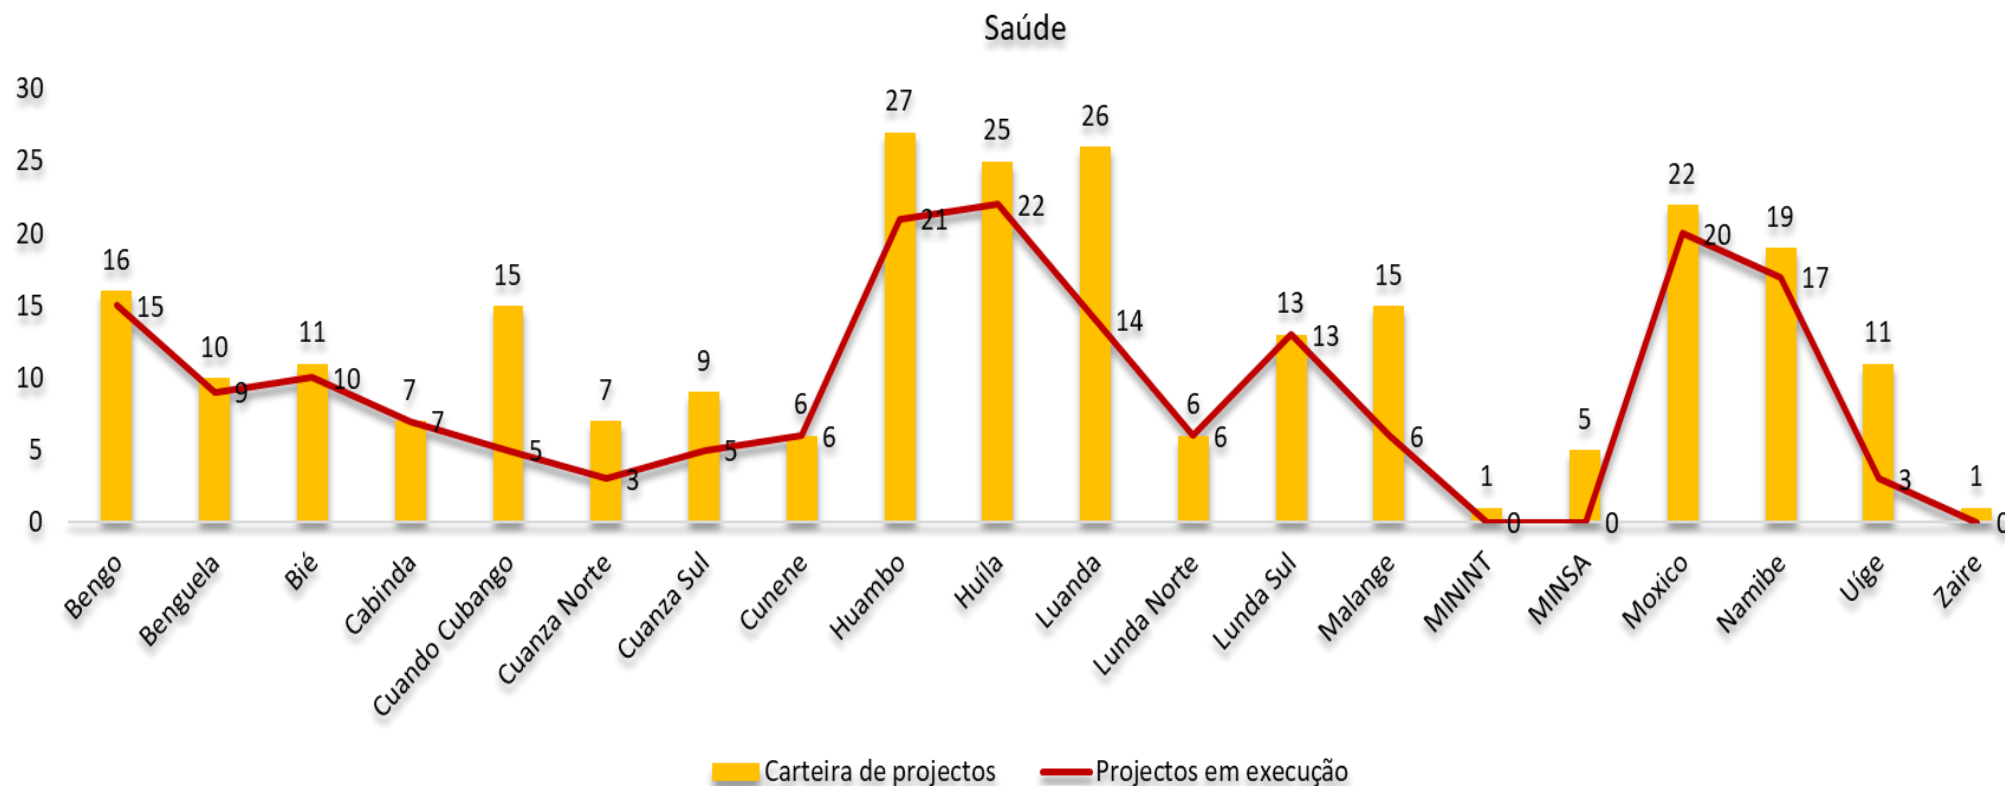

3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

INFRAESTRUTURAS SOCIAIS

Quantidade de projectos do sector das infraestruturas sociais

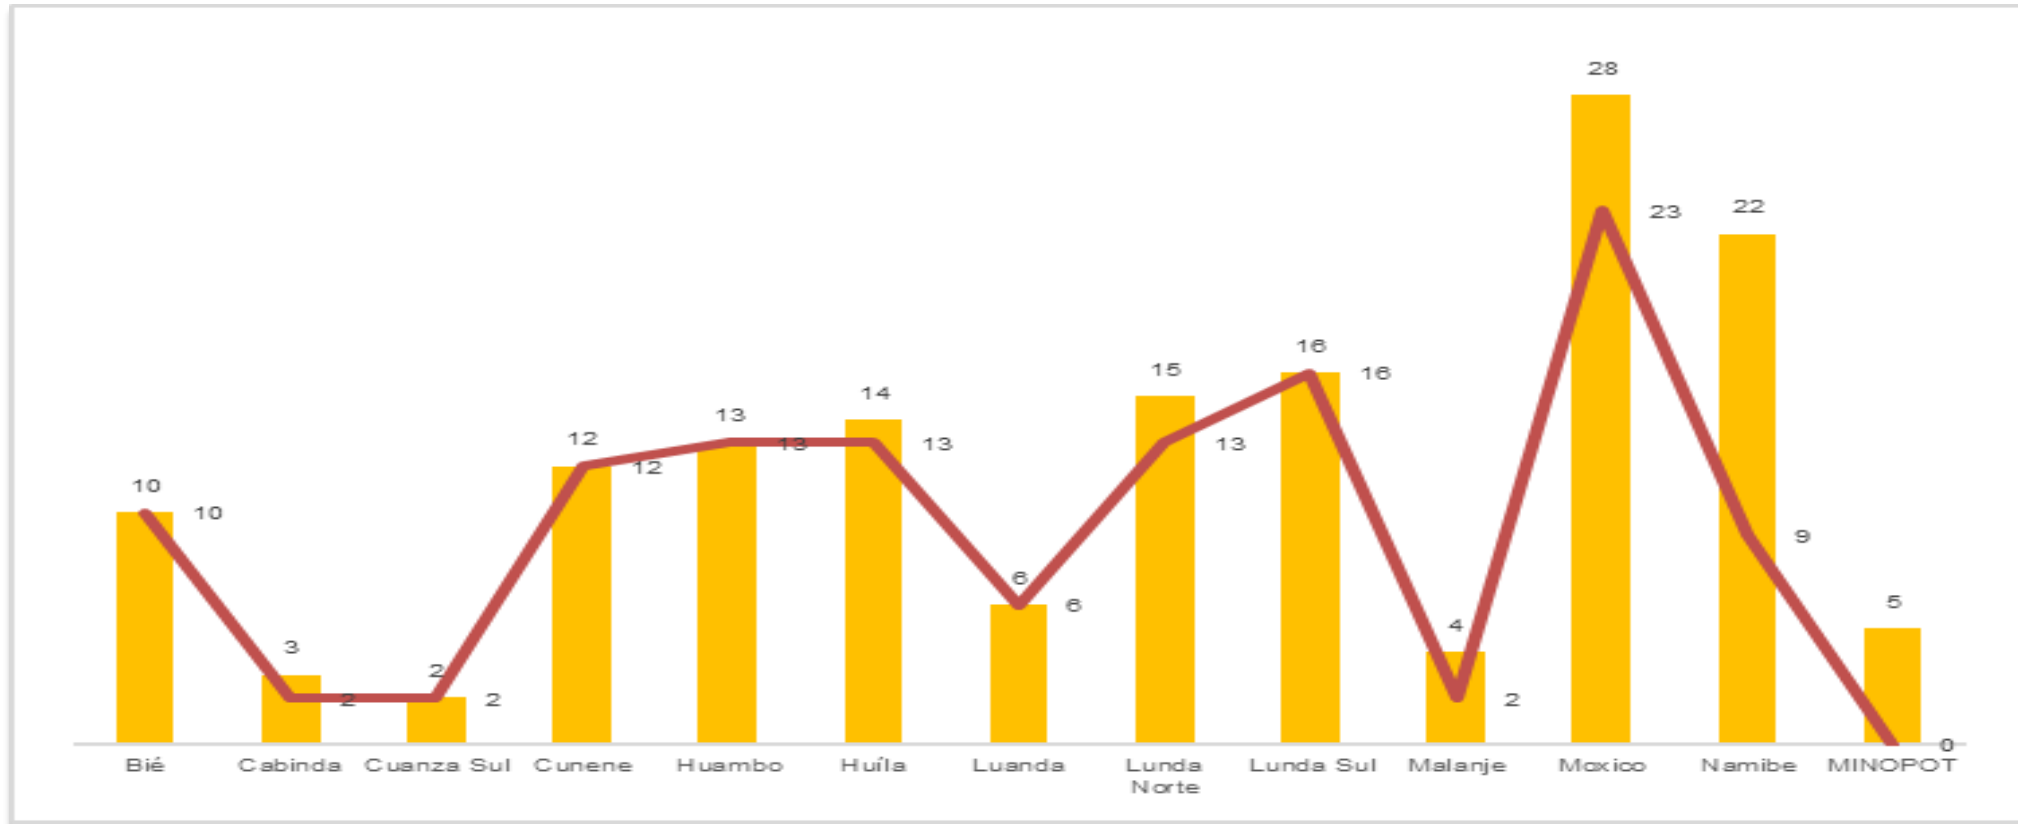

3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Projectos do sector de Segurança e Ordem Pública


Segurança e Ordem Pública



3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

VIAS DE COMUNICAÇÃO

Projectos no Sector das Vias de Comunicação

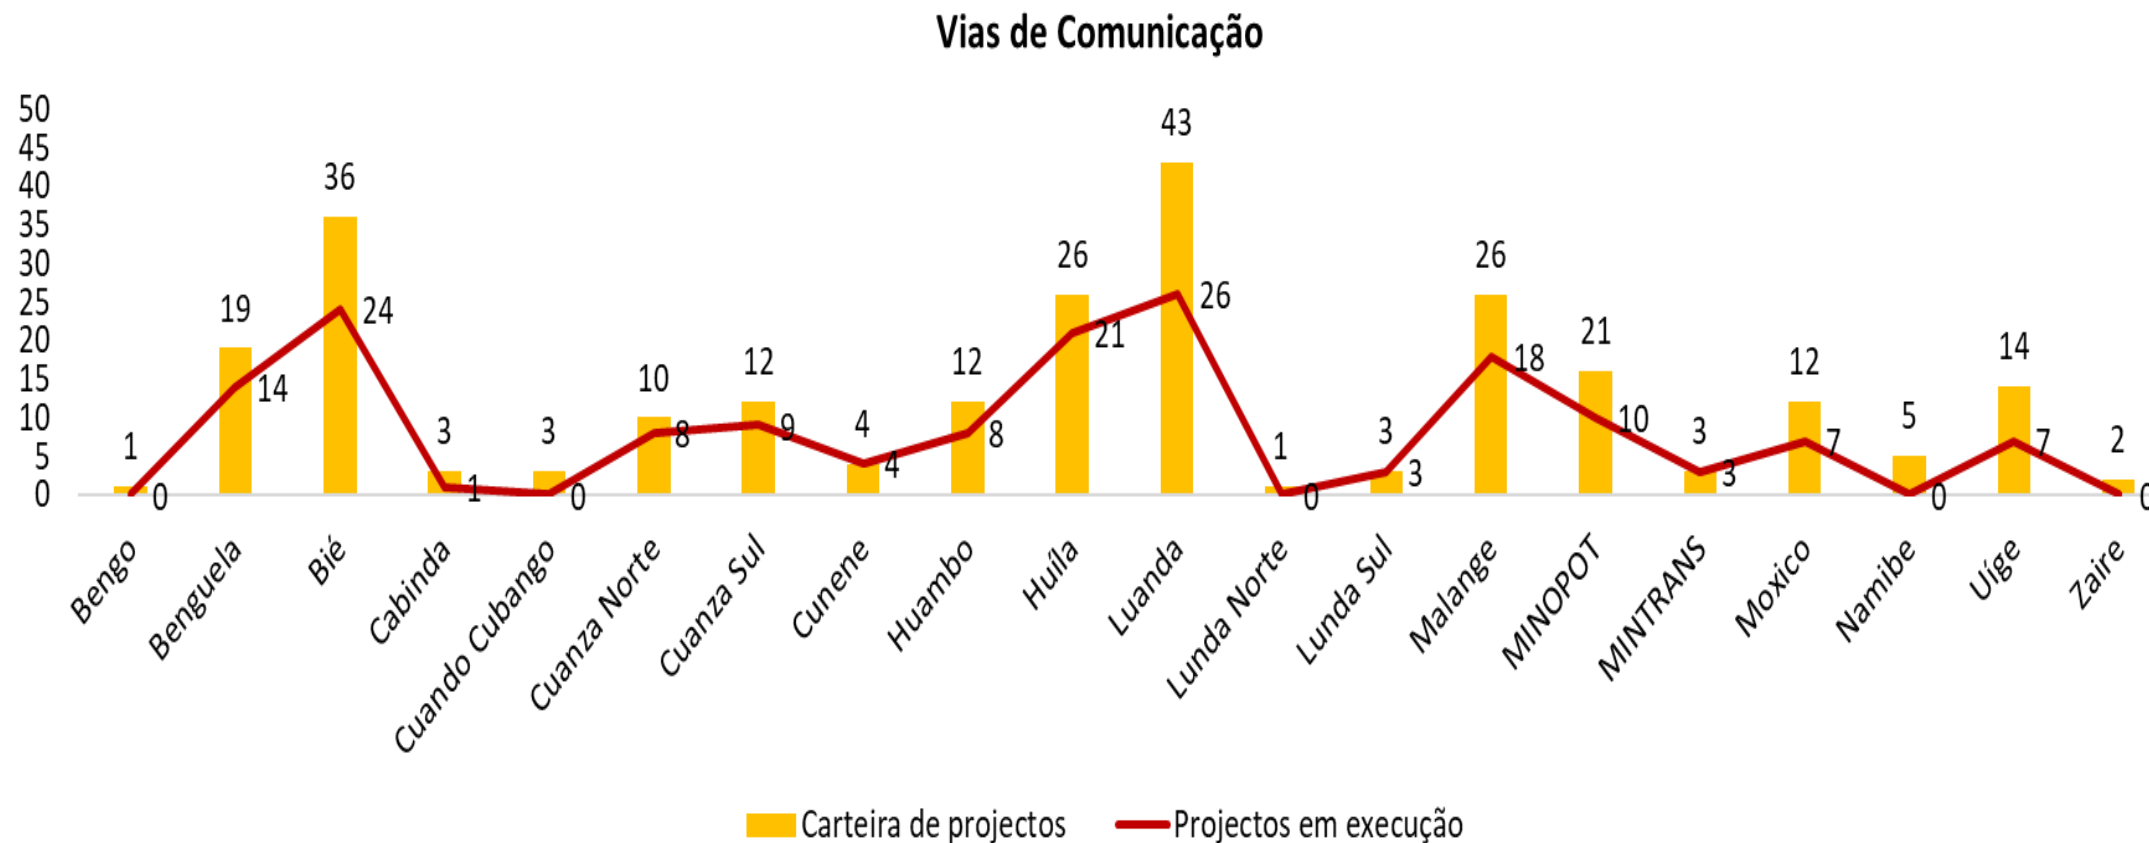

3 – BALANÇO DAS ACTIVIDADES POR SECTOR

INFRAESTRUTURAS AUTÁRQUICAS

Quantidade de projectos das infraestruturas autárquicas



4 – ANÁLISE FOFA

PONTOS FORTES

- Mais 80% dos projectos em execução à cargo dos Órgãos da Administração Local do Estado.
- Transparência
- 87% de cumprimento das condições precedentes
- Resultados tangíveis
- Nenhum projecto com execução financeira superior 15% que a execução física
- Formação dos gestores públicos
- Rigor na execução
- Critérios de validação de custos e resultados padronizados
- Garantia de passagem de activos a património do Estado
- Padronização a nível nacional da metodologia de execução e avaliação de projectos
- Reforço da capacitação da gestão local

PONTOS FRACOS

- Restrições na mobilidade de pessoas e bens
- Burocracia na execução do PIIM
- Centralização dos processos de validação
- Ausência de um plano de comunicação local
- Falta de articulação entre serviços dos Governos Provinciais e Municípios
- Falta de articulação entre executores centrais e locais
- Debilidades técnicas locais, consubstanciada no envio de documentação inconforme
- Interferência dos Governos Provinciais nas actividades das DPF's
- Fraudes em procedimentos concursais
- Tentativas de execução de projectos não validados

4 – ANÁLISE FOFA


OPORTUNIDADES

- Alinhamento com os programas de desconcentração e descentralização administrativa e financeira
- Melhoria da qualidade da despesa pública
- Capacitação dos gestores locais
- Melhoria dos critérios de priorização de projectos
- Depuração do Orçamento
- Orçamentação realista e rigorosa
- Alinhamento da despesa com os eixos de desenvolvimento
- Melhoria do processo de descentralização financeira
- Conclusão de projectos
- Transferência de competências para os gestores locais

AMEAÇAS


- Depreciação da moeda
- Pandemia COVID19
- Mau estado das vias de acesso
- Atrasos de execução
- Má execução da despesa pública
- Desvios de recursos públicos
- Não responsabilização de gestores

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

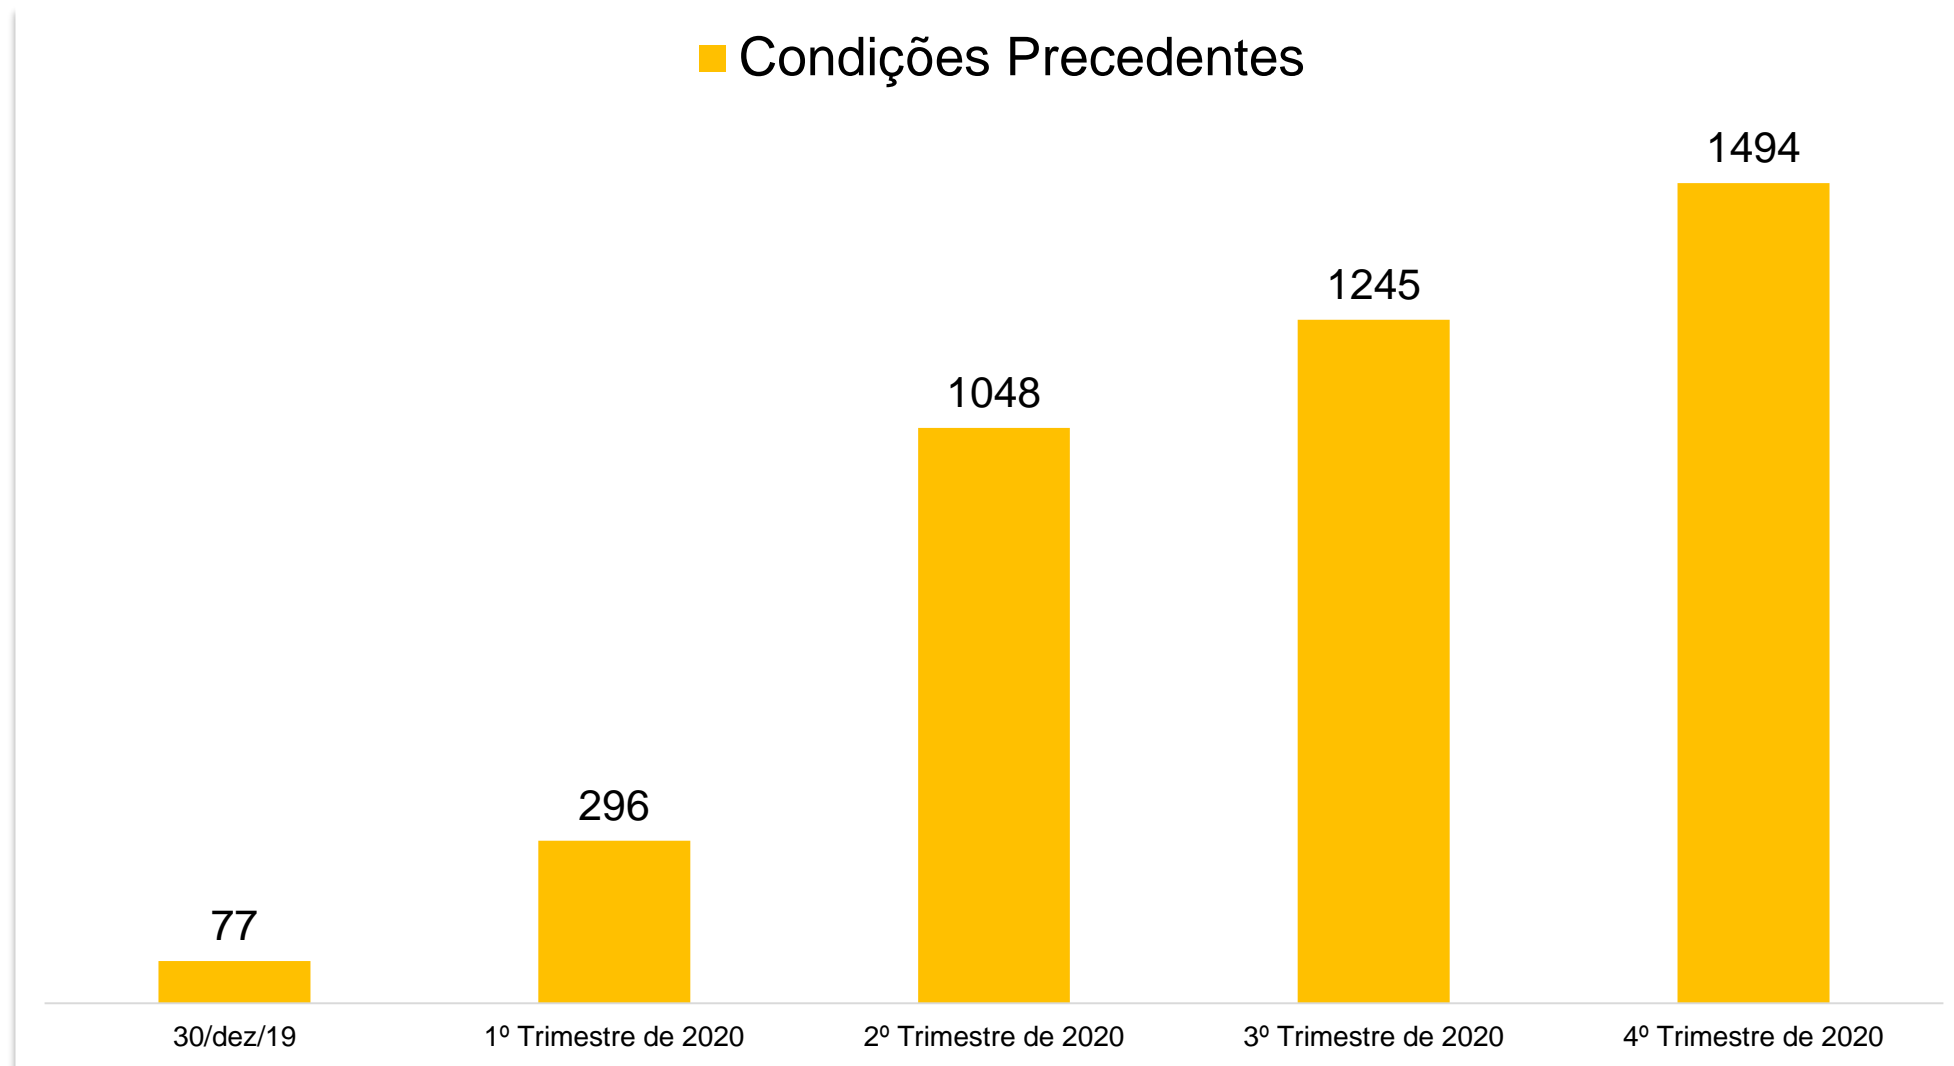

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS



■ Projectos em Execução por Período

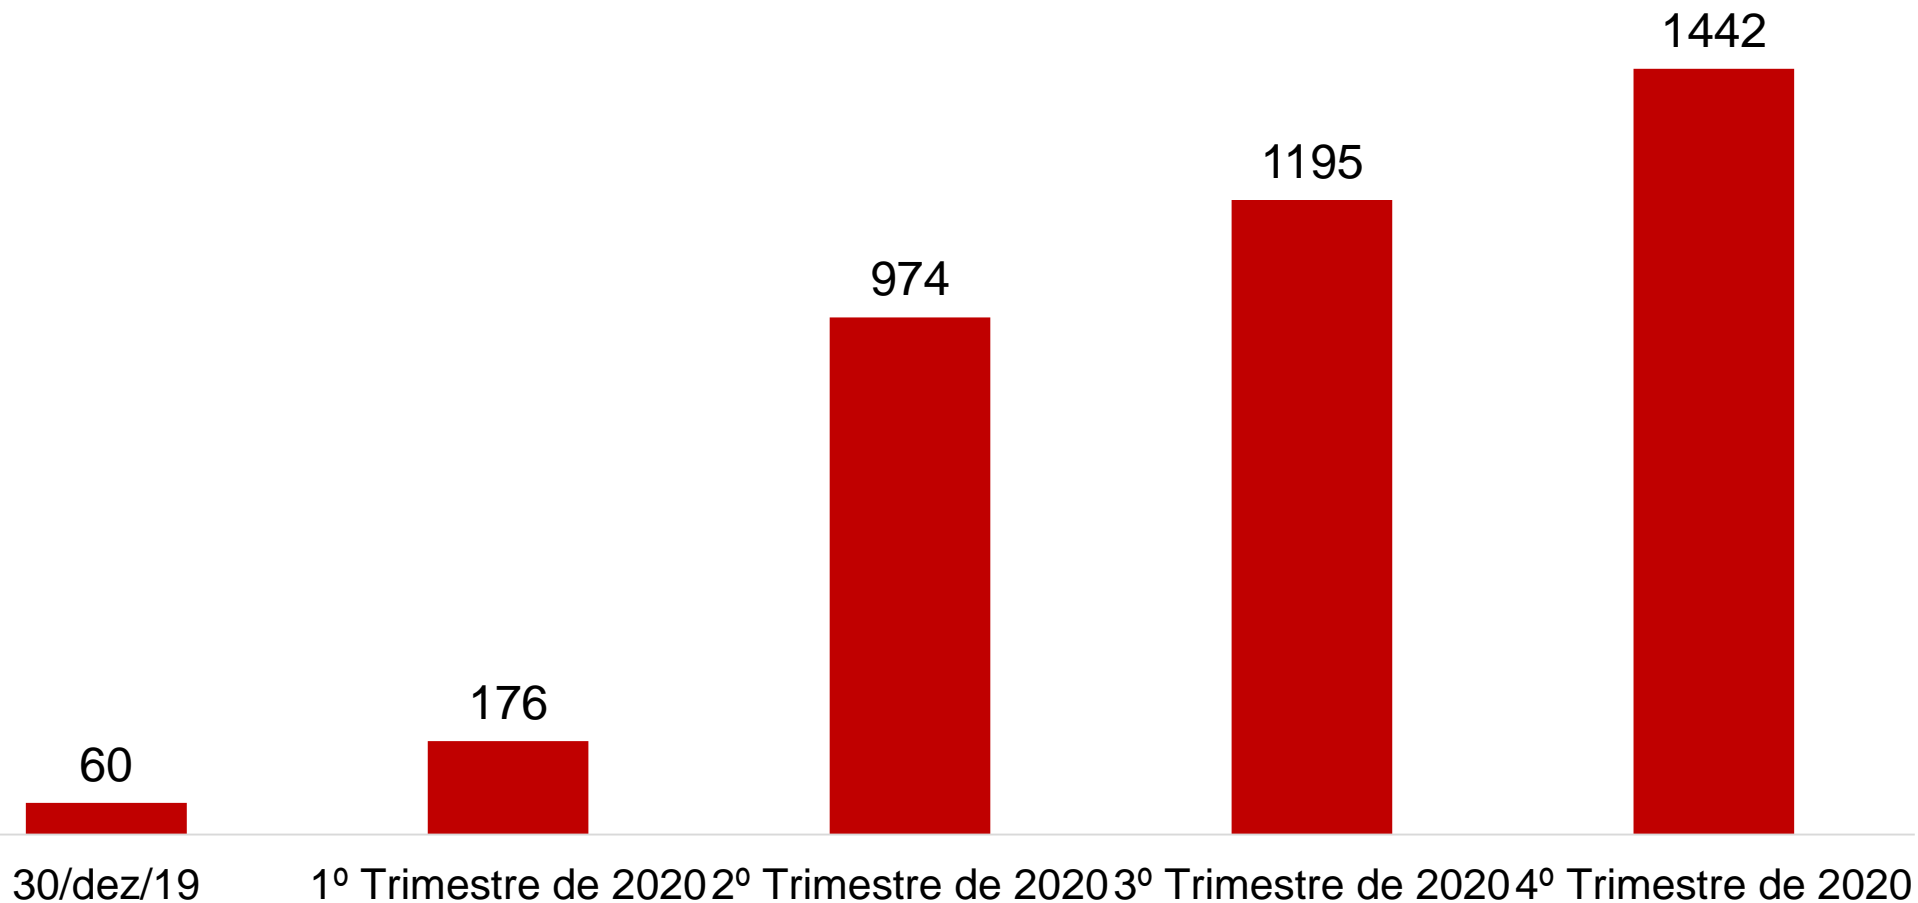

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Concretização das Acções de Reforço da Desconcentração Administrativa e Financeira

Percentagem Por Tipologia

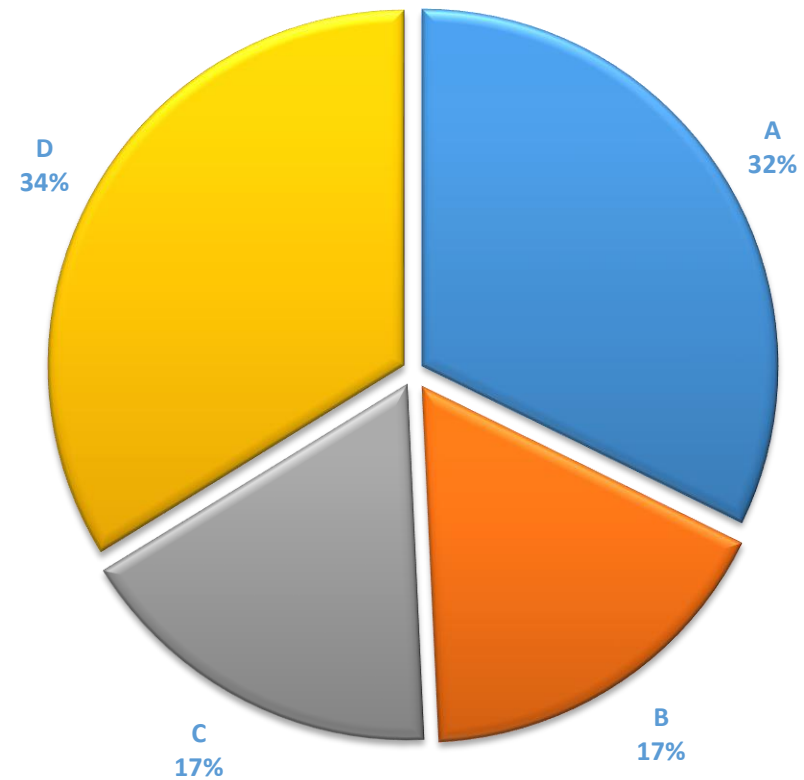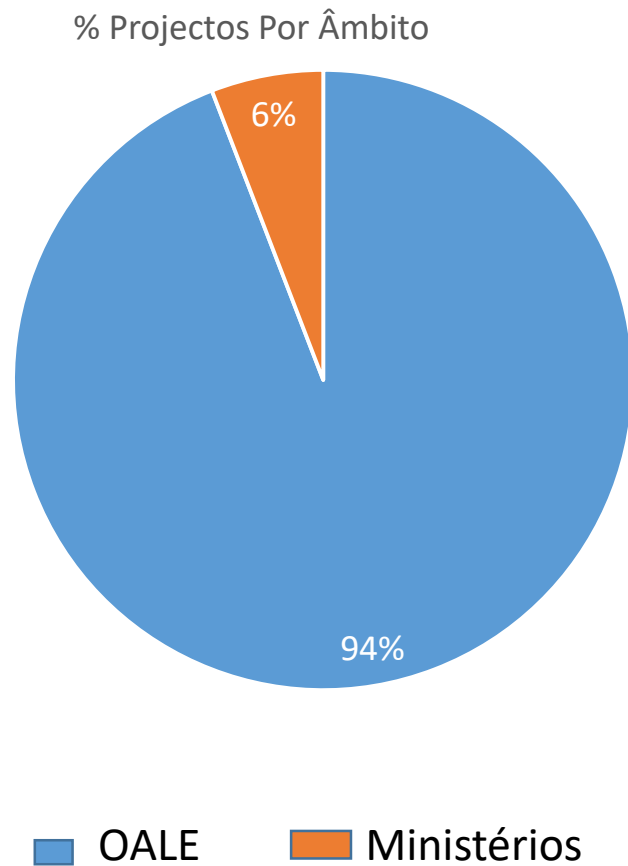


5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

No âmbito do PIIM, foram concluídos os pagamentos bem como a execução física referentes a 85 projectos, sendo 34 projectos de investimento público e 51 de despesas de apoio ao desenvolvimento.

Importa realçar que registam-se, neste momento, cerca de 155 projectos em fase de conclusão.

5 – RESULTADOS ALCANÇADOS

Gráfico 24 - Postos de trabalho temporários gerados

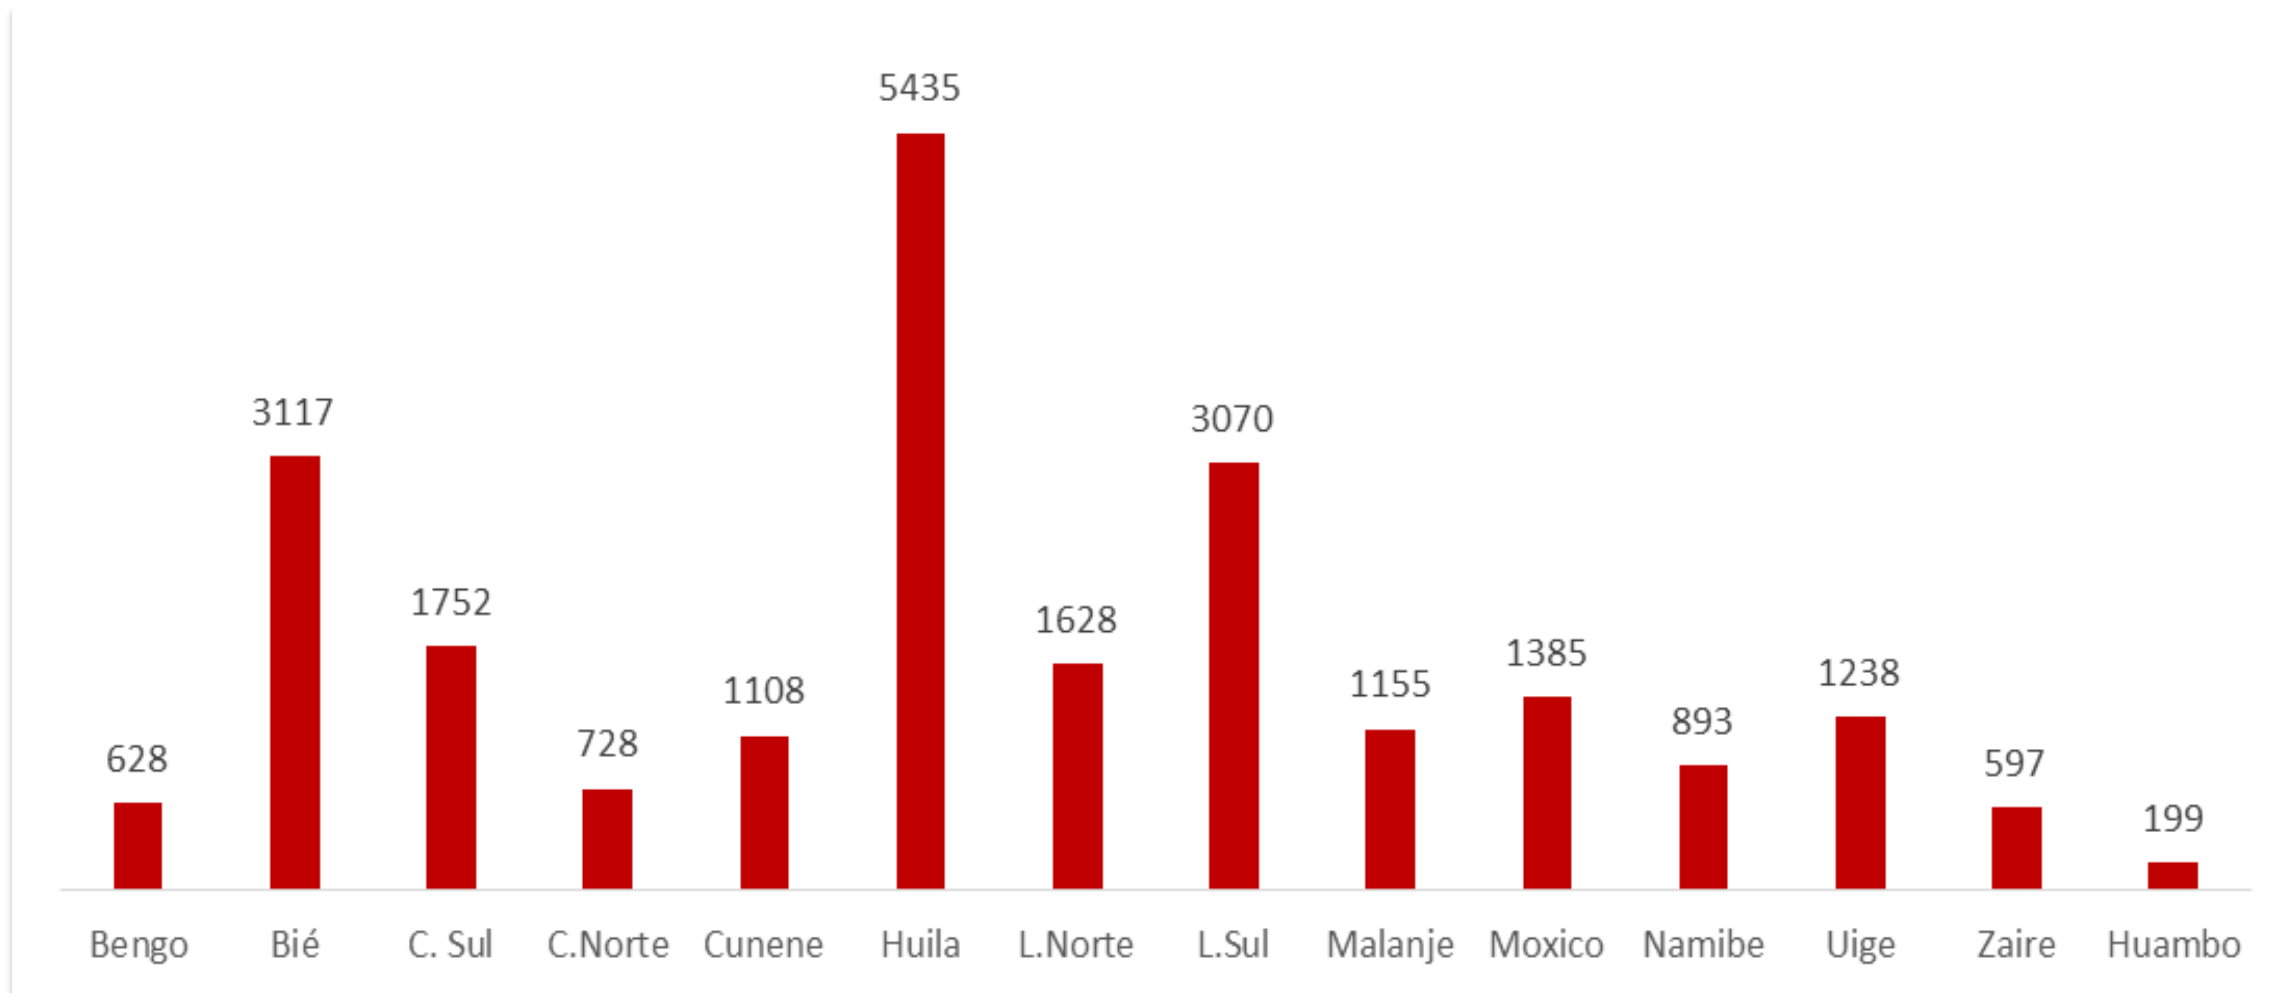

Obrigada



www.piim.gov.ao



GOVERNO DE
ANGOLA
